

RVMT – Hinderbeeld Noord-Holland 2026-3 (definitief)

Onderwerp:	Hinderbeeld Regionaal Verkeersmanagementteam (RVMT) Noord-Holland
Datum:	16 juli 2026
Kenmerk:	Definitief

Inleiding

Het Regionaal Verkeersmanagementteam Noord-Holland (RVMT-NH) is medeverantwoordelijk voor het functioneren van de infranetwerken in de provincie Noord-Holland. Daarnaast heeft het RVMT een signalerende functie wanneer het functioneren van die netwerken in het geding komt. De gezamenlijke wegbeheerders hebben zich gecommitteerd aan het multimodaal Netwerkmanagementkader 2030 en de regelstrategie om het functioneren van die netwerken te borgen. Het RVMT is eveneens verantwoordelijk voor de coördinatie van inzet van het verkeersmanagement vanuit de drie verkeerscentrales in de regio. In voorgaande jaren was de aanpak vooral gericht op afzonderlijke projecten en evenementen. Dit is een suboptimale aanpak en met de hoeveelheid en impact van de nu geplande werkzaamheden en evenementen, is behoefte aan een project-overstijgende en overkoepelende aanpak/regie op het verkeersmanagement.

Met dit 'Hinderbeeld RVMT Noord-Holland' wordt de hinder per regio en per week & weekend specifiek in beeld gebracht, waardoor vroegtijdig inzichtelijk wordt wat 'de optelsom' en het gezamenlijke risico van projecten, evenementen en andere events op de infranetwerken is. Dit Hinderbeeld helpt om op tactisch niveau beter te sturen, waardoor de hinder verminderd kan worden en/of de effecten beperkt kunnen worden door eventueel extra (mobiliteitsmanagement)maatregelen te nemen. Het hinderbeeld is opgesteld op basis van een kwalitatieve inschatting. Dit is gebaseerd op expert judgement van specialisten en de infrabeheerders.

De doelstellingen zijn:


- Het vergroten van inzicht van (gelijktijdige) verstoringen op het regionale infranetwerk en inzicht in de onderlinge relaties tussen projecten hiervan;
- Op basis hiervan bepalen of en zo ja welke vorm van (coördinatie van) verkeersmanagement noodzakelijk is;
- Het creëren van een gedragen hinderbeeld. Welke impact hebben de werkzaamheden, evenementen en andere factoren (zoals vakanties) op het functioneren van de infranetwerken. Enerzijds ter voorbereiding op verkeersmanagement en anderzijds het informeren van de ambtelijke organisatie en bestuurders op welke momenten het functioneren van de regionale infranetwerken in het geding is en anderzijds om deze informatie te delen met verantwoordelijken voor de (regionale) hindercommunicatie en mobiliteitsmanagement;
- Het vergroten van draagvlak voor een gezamenlijke aanpak op het gebied van verkeersmanagement bij zowel realisatieprojecten, evenementen als verkeerscentrales.

In een digitale sessie op dinsdag 16 juni 2026 is het RVMT-hinderbeeld van de provincie geactualiseerd tot en met eind 2026 en met een doorkijk naar 2027 met de informatie die momenteel beschikbaar is. Het betreft daarom een momentopname. De planning van werkzaamheden is mogelijk nog aan veranderingen onderhevig. Tevens is recent duidelijk geworden dat binnen Rijkswaterstaat een herprioritering plaatsvindt van geprogrammeerde projecten en daarmee geplande werkzaamheden in 2027. Op dit moment (1 juli 2026) is nog onduidelijk of en zo ja welke impact dit heeft op de regionale werkenplanning van Noord-Holland voor volgend jaar. Uitgegaan is van de tot nu toe bekende programmering. Eventuele wijzigingen worden meegenomen in komende updates van het RVMT-hinderbeeld. In bijlage 3 is een overzicht van de deelnemers weergegeven.

Hinderbeeld

Bij de uitwerking van het hinderbeeld is de gebiedsindeling van de RegioRegie-gebieden aangevuld met de regio Amsterdam (gebied Amsterdam Bereikbaar). Op basis van expert judgement is een kwalitatieve hinderinschatting gedaan. Hierbij is voortgebouwd op de bestaande categorie-indeling uit de eerdere Kwartaalrapportage met een score van 1 tot 3 pionnen. Vanwege de grote hinder van onder andere werkzaamheden aan de Coentunnel, Zuidasdok en de impact van SAIL, zijn hier dit jaar twee categorieën aan toegevoegd. In onderstaande tabel is een toelichting gegeven op alle vijf de categorieën.

In bijlage 1 en 2 is allereerst het hinderbeeld in kalendervorm weergegeven en vervolgens per week de bijzonderheden.

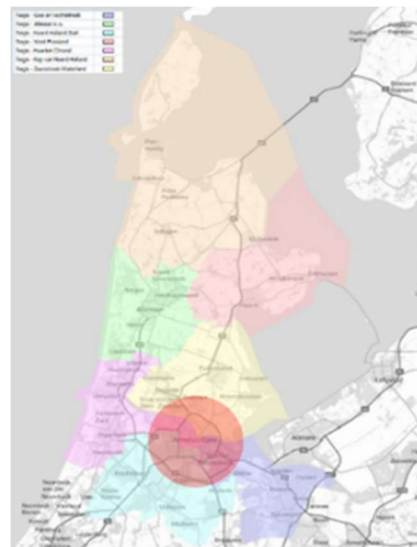

Score	Toelichting
1	 Lokale verkeershinder of verminderde bereikbaarheid vanwege werkzaamheden. Extra reistijd veelal minder dan 15 minuten .
2	 Eén of meerdere werkzaamheden waardoor rekening gehouden moet worden met extra reistijd tussen 15 – 45 minuten .
3	 Eén of meerdere werkzaamheden waardoor rekening gehouden moet worden met extra reistijd van 45 – 60 minuten en stagnatie op meerdere delen van het netwerk.
4	 Eén of meerdere werkzaamheden met exceptionele effecten. Extra reistijd 60 minuten of meer en verkeershinder op netwerken van meerdere wegbeheerders .
5	 Eén of meerdere werkzaamheden met exceptionele effecten. Extra reistijd 60 minuten of meer én/of ernstige stagnatie gedurende meerdere delen van de dag waarbij functioneren van het wegennet wordt bedreigd .

Update na RegioRegie 2026-2 en 2026-3

Het Hinderbeeld is geüpdatet met input uit Melvin en de afstemlijsten van de verschillende regio's. Dit leidt tot een concretisering van de planning. Bij een aantal werken zijn uitvoeringsperiodes verschoven of uitgesteld. Dit heeft echter geen grote invloed gehad op het algehele beeld van raakvlakken en hinderpieken. De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder beschreven. De samenvatting is eveneens aangepast.

- In de laatste drie weekenden van augustus is de Waterwolf tunnel inclusief het kruispunt N201/N232 afgesloten. In het weekend van vrijdag 21 augustus tot maandag 24 augustus zijn er eveneens werkzaamheden aan knooppunt De Nieuwe Meer, minder capaciteit op de A4 richting De Nieuwe Meer en is het WK hockey en de Dutch Grand Prix op Zandvoort.
- De fasering van de werkzaamheden aan de N205 bij Haarlem zijn aangepast en geconcretiseerd.
- Vanaf eind oktober t/m begin december vinden werkzaamheden plaats aan de N247 nabij Monnickendam met een 2-0 systeem. Voor de op- en afbouw van dit systeem geldt een weekendafsluiting.
- De N248 zit van half augustus tot half december dicht in westelijke richting tussen Middenmeer en Kolhorn.
- De N249 is van eind augustus tot eind oktober volledig dicht tussen de N248 en de N99.
- De werkzaamheden aan de N244 in de Middenbeemster zijn verplaatst naar Q2 2027.

Samenvatting

Naast de reguliere langlopende werkzaamheden van de A10 Zuidasdok en A9 Badhoevedorp-Holendrecht zijn gedurende de zomer (juli en augustus) van 2026 meerdere grootschalige en impactvolle werkzaamheden gepland die verspreid over Noord-Holland plaatsvinden. Onderstaand staan puntsgewijs deze werkzaamheden beschreven.

- Ten behoeve van groot onderhoud is de A1 afgesloten tussen de knooppunten Eemnes en Muiderberg van 3 juli t/m 17 augustus (score 2). In twee weken in augustus is eveneens geen treinverkeer tussen Weesp en Almere. Door deze combinatie van werkzaamheden wordt extra verkeer verwacht op de omleidingsroute A27/A6 en het onderliggend wegennet richting de A9 en A2. Deze werkzaamheden zijn van invloed op de provincie Utrecht en hebben impact op Gooi en Vechtstreek waarbij rekening gehouden moet worden met maximaal 45 minuten extra reistijd.
- Van 12 juli t/m 8 augustus is de A9 Wijkertunnel volledig afgesloten (score 3). Deze afsluiting zorgt voor hinder in de regio Haarlem-IJmond. Bij gelijktijdige verstoringen van andere oeververbindingen kunnen de netwerkeffecten zich uitbreiden naar onder andere Amsterdam en Zaanstreek-Waterland.
- In de kop van Noord-Holland vinden vanaf half augustus tot half december werkzaamheden plaats aan de N248 die in westelijke richting dicht is tussen Middenmeer en Kolhorn (score 2). Vanaf eind augustus tot eind oktober vallen deze werkzaamheden samen met een volledige afsluiting van de N249 tussen De Stolpen en Van Ewijcksluis met een gecombineerde score 3. Hierbij moet er rekening worden gehouden met extra reistijd van 45 tot 60 minuten.
- In Amsterdam-Zuid staan gelijktijdig meerdere werkzaamheden op de planning van juli t/m eind augustus. Dit is een afsluiting van de S108 Amstelveenseweg, verschillende afsluitingen rondom De Boelelaan en werkzaamheden rond de Beethovenstraat/Apollolaan. Elders in Amsterdam zijn de langlopende werkzaamheden aan de Jan Evertsenstraat, S107 Johan Huizingalaan en S113 Middenweg, en rijden er geen metro's tussen Amsterdam-Zuid en Spaklerweg/Van der Madeweg. Een combinatie van deze werkzaamheden vergroot de druk op het stedelijk netwerk.
- In het weekend van vrijdag 21 augustus tot maandag 24 augustus vallen meerdere werkzaamheden en evenementen samen met impact op Amsterdam en Noord-Holland Zuid (score 3). Dit zijn werkzaamheden aan de Waterwolf tunnel inclusief het kruispunt N201/N231 en beperkte capaciteit op de A4 tussen knooppunten Badhoevedorp en De Nieuwe Meer, gecombineerd met de Dutch Grand Prix en het WK Hockey in Amstelveen.

In het laatste kwartaal van 2026 vinden de volgende werkzaamheden plaats naast diverse weekendafsluiting van de A9 Badhoevedorp-Holendrecht en de A10 Zuidasdok:

- Er vinden werkzaamheden plaats aan de N205 tussen Rottepolderplein-Zuid en Haarlem. Van begin september tot eind oktober gaan er verschillende wegvakken in verschillende fasen dicht. Tussen half september en begin oktober is er minder capaciteit beschikbaar tussen de A9 en de grens met Haarlem. Daaropvolgend vinden nog verschillende afsluitingen plaats van verbindingswegen van Rottepolderplein-Zuid plaats (score 2). Gelijktijdig met deze werkzaamheden is van 8 tot 10 oktober de Buitenrustbrug Haarlem-in dicht (gecombineerde score 3). Deze werkzaamheden aan de N205 hebben allemaal in meer of mindere mate effect op de bereikbaarheid vanaf de A9 richting Haarlem of Vijfhuizen. De extra reistijd varieert tussen de 15 en 45 minuten afhankelijk van de doorgang en het moment in de week.
- In Zaanstreek-Waterland vinden werkzaamheden plaats aan de N247 nabij Monnickendam. Deze duren van eind oktober tot begin december. De werkzaamheden aan de N247 starten en eindigen met een weekendafsluiting ten behoeve van het op- en afbouw van het verkeerssysteem. In de tussenliggende periode is doorgang, maar is minder capaciteit beschikbaar.

Doorkijk 2027

Er vindt een herprioritering plaats van de geprogrammeerde projecten van Rijkswaterstaat en daarmee de geplande werkzaamheden in 2027. Tot op heden is nog onduidelijk of en zo ja welke impact dit heeft op de regionale werkenplanning van Noord-Holland voor volgend jaar. Onderstaand is een toelichting weergegeven over de tot nu toe bekende programmering van werkzaamheden. In de bijlage is het totaaloverzicht opgenomen van het eerste en tweede half jaar van 2027. De specifieke duiding per week/weekend voor 2027 is niet opgenomen in dit memo.

In het eerste en tweede kwartaal van 2027 zijn frequent (weekend)afsluitingen voorzien voor A10 Zuidasdok en A9 Badhoevedorp-Holendrecht (score 2). Voor Zuidasdok staan weekend- en weekafsluitingen gepland in de voorjaars-, mei- en zomervakantie. In de zomer is de A10 Zuid in totaal vijf weken afgesloten.

In Zaanstreek-Waterland staan in het tweede kwartaal twee grootschalige en impactvolle werkzaamheden op de planning. De provincie is voornemens de N244 ter hoogte van Middenbeemster af te sluiten van 15 maart t/m 31 mei (score 2). Door deze werkzaamheden moeten weggebruikers rekeninghouden met 15 tot 45 minuten extra reistijd. Gedurende deze periode, specifiek van vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei, staat vooralsnog een 16-daagse afsluiting gepland van de N516 in Zaandam (score 3). Een gelijktijdigheid van beide werkzaamheden is van invloed op de bereikbaarheid ten westen van de A7, waarbij weggebruikers rekening moeten houden met 45 tot 60 minuten extra reistijd.

Vanaf begin juni t/m eind augustus in kwartaal drie staan er vooralsnog meerdere langdurige werkzaamheden in en rond Amsterdam op de planning. In juni start Rijkswaterstaat met de werkzaamheden aan de A4 Schiphol tunnel. Gestart wordt met de westelijke parallelbuis. Deze afsluiting heeft beperkt invloed. Verkeer richting Schiphol kan via de hoofdrijbaan en een doorsteek naar Schiphol. Daaropvolgend gaat de westelijke hoofdrijbaan richting Rotterdam dicht, gevolgd door de oostelijke parallelbuis en oostelijke hoofdrijbaan richting Amsterdam. In deze zomerperiode van 2027 heeft Rijkswaterstaat ook werkzaamheden gepland aan de A5 Westelijke Randweg tussen knooppunt Raasdorp en de Coentunnel, de A1 tussen knooppunt Muiderberg en Eemnes en zijn er afsluitingen van A10 Zuidasdok inclusief de A4 knooppunt Badhoevedorp. Ook de gemeente Amsterdam heeft diverse werkzaamheden gepland, waaronder een afgesloten IJ-tunnel, Arenatunnel, S102 Basisweg en de Overtoomsesluis/S106 Surinameplein. Daarnaast heeft de provincie eveneens twee impactvolle werkzaamheden gepland rond Amsterdam. Dit is de N203 Brug Krommenie, waarbij minder capaciteit beschikbaar is op de N203, en twee keer een meerweekse afsluiting van de N201 Waterwolf tunnel. Van begin t/m eind juli is de tunnel in westelijke richting naar de A9 afgesloten. Van begin tot half augustus is de oostelijke richting afgesloten. Een combinatie van deze werkzaamheden heeft impact op het wegennetwerk van Amsterdam en Noord-Holland Zuid, en krijgt daarvoor score 4. Door de werkzaamheden is de kans op verkeershinder groot en kan de reistijd oplopen tot 60 minuten of meer. Hierdoor komt het functioneren en de robuustheid van het netwerk onder druk te staan met verkeershinder op netwerken van meerdere wegbeheerders.

Hinderbeeld Regionaal Verkeersmanagement Team Noord-Holland																		Noord Holland bereikbaar
			Amsterdam en omgeving		Zaanstreek- Waterland		Noord-Holland- Zuid		Gooi- en Vechtstreek		Haarlem-IJmond		Alkmaar e.o.		Westfriesland		Kop van Noord-Holland	
Week	van:	tot:	Week	Weekend	Week	Weekend	Week	Weekend	Week	Weekend	Week	Weekend	Week	Weekend	Week	Weekend	Week	Weekend
Week 27	ma 29-6	zo 5-7	1	1			1	1		2								
Week 28	ma 6-7	zo 12-7	1	1			1	1	2	2								
Week 29	ma 13-7	zo 19-7	1	1			1	1	2	2	3	3	1	1			2	
Week 30	ma 20-7	zo 26-7	1	2			1	2	2	2	3	3	1	1				
Week 31	ma 27-7	zo 2-8	1	1			1	1	2	2	3	3	1	1				
Week 32	ma 3-8	zo 9-8	1	1			1	1	2	2	3		1					
Week 33	ma 10-8	zo 16-8	1	2			1	2	2	2								2
Week 34	ma 17-8	zo 23-8	1	3		1		3			2	2					2	2
Week 35	ma 24-8	zo 30-8	1	2				2									3	3
Week 36	ma 31-8	zo 6-9	1	1				1									3	3
Week 37	ma 7-9	zo 13-9	1	2				2				2					3	3
Week 38	ma 14-9	zo 20-9	1	2			1	1			2	2					3	3
Week 39	ma 21-9	zo 27-9	1	2			1	2			2	2					3	3
Week 40	ma 28-9	zo 4-10	1	1							2	2					3	3
Week 41	ma 5-10	zo 11-10	1	2				2			2	3					3	3
Week 42	ma 12-10	zo 18-10	1	1				1			2	2	1				3	3
Week 43	ma 19-10	zo 25-10	1	2		2	1	2			2	2					3	2
Week 44	ma 26-10	zo 1-11	1	1	1	1					2	2					2	2
Week 45	ma 2-11	zo 8-11	1	2	1	2		2			1	1	1	1			2	2
Week 46	ma 9-11	zo 15-11	1	1	1	2							1				2	2
Week 47	ma 16-11	zo 22-11	1	1	1	1											2	2
Week 48	ma 23-11	zo 29-11	1	2	1	1		2									2	2
Week 49	ma 30-11	zo 6-12	1	1	1	2											2	2
Week 50	ma 7-12	zo 13-12	1	1													2	2
Week 51	ma 14-12	zo 20-12	1	2				2										
Week 52	ma 21-12	zo 27-12	1	1														

1

2

3

4

5

Lokale verkeershinder of verminderde bereikbaarheid vanwege werkzaamheden. Extra reistijd veelal **minder dan 15 minuten**.

Eén of meerdere werkzaamheden waardoor rekening gehouden moet worden met extra reistijd tussen **15 – 45 minuten**.

Eén of meerdere werkzaamheden waardoor rekening gehouden moet worden met extra reistijd van **45 – 60 minuten** en stagnatie op meerdere delen van het netwerk.

Eén of meerdere werkzaamheden met exceptionele effecten. **Extra reistijd 60 minuten** of meer en **verkeershinder op netwerken van meerdere wegbeheerders**.

Eén of meerdere werkzaamheden met exceptionele effecten. **Extra reistijd 60 minuten** of meer én/of ernstige stagnatie gedurende meerdere delen van de dag waarbij **functioneren van het wegennet wordt bedreigd**.

Noord
Holland
bereikbaar

5

Hinderbeeld Regionaal Verkeersmanagement Team Noord-Holland																		Noord Holland bereikbaar
			Amsterdam en omgeving		Zaanstreek- Waterland		Noord-Holland- Zuid		Gooi- en Vechtstreek		Haarlem-IJmond		Alkmaar e.o.		Westfriesland		Kop van Noord-Holland	
Week	van:	tot:	Week	Weekend	Week	Weekend	Week	Weekend	Week	Weekend	Week	Weekend	Week	Weekend	Week	Weekend	Week	Weekend
Week 53	ma 28-12	zo 3-1																
Week 1	ma 4-1	zo 10-1																
Week 2	ma 11-1	zo 17-1		2				2										
Week 3	ma 18-1	zo 24-1		2				2										
Week 4	ma 25-1	zo 31-1		2				2										
Week 5	ma 1-2	zo 7-2		2				2										
Week 6	ma 8-2	zo 14-2																
Week 7	ma 15-2	zo 21-2		1				1										
Week 8	ma 22-2	zo 28-2	1	1			1	1										
Week 9	ma 1-3	zo 7-3		2				2										
Week 10	ma 8-3	zo 14-3		2				2										
Week 11	ma 15-3	zo 21-3		2	2	2		2										
Week 12	ma 22-3	zo 28-3		2	2	2		2										
Week 13	ma 29-3	zo 4-4			2	2		2									1	1
Week 14	ma 5-4	zo 11-4		2	2	2		2		2							1	1
Week 15	ma 12-4	zo 18-4		2	2	2		2		2							1	1
Week 16	ma 19-4	zo 25-4		2	2	3		2		2							1	1
Week 17	ma 26-4	zo 2-5			3	3											1	1
Week 18	ma 3-5	zo 9-5			3	3											1	1
Week 19	ma 10-5	zo 16-5		2	2	2		2									1	1
Week 20	ma 17-5	zo 23-5		2	2	2		2									1	1
Week 21	ma 24-5	zo 30-5		2	2	2		2									1	1
Week 22	ma 31-5	zo 6-6					1	1									1	1
Week 23	ma 7-6	zo 13-6					1	1									1	1
Week 24	ma 14-6	zo 20-6					1	1									1	1
Week 25	ma 21-6	zo 27-6					1	1									1	1
Week 26	ma 28-6	zo 4-7					1	1										

1

2

3

4

5

Lokale verkeershinder of verminderde bereikbaarheid vanwege werkzaamheden. Extra reistijd veelal **minder dan 15 minuten**.

Eén of meerdere werkzaamheden waardoor rekening gehouden moet worden met extra reistijd tussen **15 – 45 minuten**.

Eén of meerdere werkzaamheden waardoor rekening gehouden moet worden met extra reistijd van **45 – 60 minuten** en stagnatie op meerdere delen van het netwerk.

Eén of meerdere werkzaamheden met exceptionele effecten. **Extra reistijd 60 minuten** of meer en **verkeershinder op netwerken van meerdere wegbeheerders**.

Eén of meerdere werkzaamheden met exceptionele effecten. **Extra reistijd 60 minuten** of meer én/óf ernstige stagnatie gedurende meerdere delen van de dag waarbij **functioneren van het wegennet wordt bedreigd**.

Noord
Holland
bereikbaar

6

Hinderbeeld Regionaal Verkeersmanagement Team Noord-Holland																		Noord Holland bereikbaar
			Amsterdam en omgeving		Zaanstreek- Waterland		Noord-Holland- Zuid		Gooi- en Vechtstreek		Haarlem-IJmond		Alkmaar e.o.		Westfriesland		Kop van Noord-Holland	
Week	van:	tot:	Week	Weekend	Week	Weekend	Week	Weekend	Week	Weekend	Week	Weekend	Week	Weekend	Week	Weekend	Week	Weekend
Week 26	ma 28-6	zo 4-7	3	3			3	3	2	2								
Week 27	ma 5-7	zo 11-7	3	4			3	4	2	2								
Week 28	ma 12-7	zo 18-7	4	4			4	4	2	2								
Week 29	ma 19-7	zo 25-7	4	4			4	4	2	2								
Week 30	ma 26-7	zo 1-8	4	4			4	4	2	2								
Week 31	ma 2-8	zo 8-8	4	4			4	4	2	2								
Week 32	ma 9-8	zo 15-8	4	4			4	4	2	2								
Week 33	ma 16-8	zo 22-8	4	5			4	5	2	2								
Week 34	ma 23-8	zo 29-8	3	3			3	3	2	2								
Week 35	ma 30-8	zo 5-9																
Week 36	ma 6-9	zo 12-9																
Week 37	ma 13-9	zo 19-9																
Week 38	ma 20-9	zo 26-9																
Week 39	ma 27-9	zo 3-10																
Week 40	ma 4-10	zo 10-10																
Week 41	ma 11-10	zo 17-10		2				2										
Week 42	ma 18-10	zo 24-10	2	2			2	2										
Week 43	ma 25-10	zo 31-10	2	2			2	2										
Week 44	ma 1-11	zo 7-11																
Week 45	ma 8-11	zo 14-11																
Week 46	ma 15-11	zo 21-11																
Week 47	ma 22-11	zo 28-11																
Week 48	ma 29-11	zo 5-12		2				2										
Week 49	ma 6-12	zo 12-12																
Week 50	ma 13-12	zo 19-12																
Week 51	ma 20-12	zo 26-12																

1

2

3

4

5

Lokale verkeershinder of verminderde bereikbaarheid vanwege werkzaamheden. Extra reistijd veelal **minder dan 15 minuten**.

Eén of meerdere werkzaamheden waardoor rekening gehouden moet worden met extra reistijd tussen **15 – 45 minuten**.

Eén of meerdere werkzaamheden waardoor rekening gehouden moet worden met extra reistijd van **45 – 60 minuten** en stagnatie op meerdere delen van het netwerk.

Eén of meerdere werkzaamheden met exceptionele effecten. **Extra reistijd 60 minuten** of meer en **verkeershinder op netwerken van meerdere wegbeheerders**.

Eén of meerdere werkzaamheden met exceptionele effecten. **Extra reistijd 60 minuten** of meer én/óf ernstige stagnatie gedurende meerdere delen van de dag waarbij **functioneren van het wegennet wordt bedreigd**.

Noord
Holland
bereikbaar

7

Bijlage 2 Duiding per week

Periode	Week 27					
Werkzaamheden	18/11 – 21/7: N240 dicht tussen Zuiderkwelweg – Zuiderdijkweg 30/3 – 27/7: Oostdijk Driehuizen dicht 29/6 – 3/7: Verschillende nachtafsluitingen A10 HRL 26/6 – 16/8: S108 gestremd t.h.v. A10 1/7 – 1/2: Werkzaamheden De Boelelaan midden (Parnassusweg – Beethovenstraat (AMS-Zuid) 1/7 – 11/7 werkzaamheden kruispunt De Boelelaan / Beethovenstraat (AMS-Zuid) 1/7 – 1/12 werkzaamheden kruispunt Beethovenstraat / Apollolaan (AMS-Zuid) 3/7 – 17/8: GVO A1 HRL (Eemnes – Muiderberg) dicht 3/7 – 10/7: A4 Re Weteringbrug 2/4 rijstroken beschikbaar					
Spoorwerkzaamheden	3/7 – 16/8: Geen metro tussen Zuid en Spaklerweg/Van der Madeweg 3/7 – 6/7: Geen treinverkeer Haarlem – Zandvoort/Leiden					
Evenementen	1/7: Ketí Koti 3/7 – 4/7: Amsterdamse Zomer					
Aandachtspunten/acties						
Score week	AMS = 1	NHZ = 1				
Score weekend	AMS = 1	NHZ = 1	GV = 2			

Periode	Week 28					
Werkzaamheden	18/11 – 21/7: N240 dicht tussen Zuiderkwelweg – Zuiderdijkweg 30/3 – 27/7: Oostdijk Driehuizen dicht 26/6 – 16/8: S108 gestremd t.h.v. A10 1/7 – 1/2: Werkzaamheden De Boelelaan midden (Parnassusweg – Beethovenstraat (AMS-Zuid) 1/7 – 11/7 werkzaamheden kruispunt De Boelelaan / Beethovenstraat (AMS-Zuid) 1/7 – 1/12 werkzaamheden kruispunt Beethovenstraat / Apollolaan (AMS-Zuid) 3/7 – 17/8: GVO A1 HRL (Eemnes – Muiderberg) dicht 10/7 – 13/7: A4 Re Weteringbrug 2/4 rijstroken beschikbaar					
Spoorwerkzaamheden	3/7 – 16/8: Geen metro tussen Zuid en Spaklerweg/Van der Madeweg					
Evenementen						
Aandachtspunten/acties						
Score week	AMS = 1	NHZ = 1	GV = 2			
Score weekend	AMS = 1	NHZ = 1	GV = 2			

Periode	Week 29					
Werkzaamheden	18/11 – 21/7: N240 dicht tussen Zuiderkwelweg – Zuiderdijkweg 30/3 – 27/7: Oostdijk Driehuizen dicht 26/6 – 16/8: S108 gestremd t.h.v. A10 1/7 – 1/2: Werkzaamheden De Boelelaan midden (Parnassusweg – Beethovenstraat (AMS-Zuid) 1/7 – 1/12 werkzaamheden kruispunt Beethovenstraat / Apollolaan (AMS-Zuid) 3/7 – 17/8: GVO A1 HRL (Eemnes – Muiderberg) dicht 13/7 – 1/8 werkzaamheden kruispunt De Boelelaan / Parnassusweg (AMS-Zuid) 13/7 – 8/8: Wijkertunnel 4 weken dicht 15/7 + 16/7: N99 Balgzandbrug dicht 17/7 – 20/7: A4 Re Weteringbrug 2/4 rijstroken beschikbaar					

Spoorwerkzaamheden	• 3/7 – 16/8: Geen metro tussen Zuid en Spaklerweg/Van der Madeweg						
Evenementen							
Aandachtspunten/ acties							
Score week	AMS = 1	ZW = 1	NHZ = 1	GV = 2	HIJ = 3	ALK = 1	KNH = 2
Score weekend	AMS = 1	ZW = 1	NHZ = 1	GV = 2	HIJ = 3	ALK = 1	

Periode	Week 30						
Werkzaamheden	• 18/11 – 21/7: N240 dicht tussen Zuiderkwelweg – Zuiderdijkweg • 30/3 – 27/7: Oostdijk Driehuizen dicht • 26/6 – 16/8: S108 gestremd t.h.v. A10 • 1/7 – 1/2: Werkzaamheden De Boelelaan midden (Parnassusweg – Beethovenstraat (AMS-Zuid) • 1/7 – 1/12 werkzaamheden kruispunt Beethovenstraat / Apollolaan (AMS-Zuid) • 3/7 – 17/8: GVO A1 HRL (Eemnes – Muiderberg) dicht • 13/7 – 1/8 werkzaamheden kruispunt De Boelelaan / Parnassusweg (AMS-Zuid) • 13/7 – 8/8: Wijkertunnel 4 weken dicht • 24/7 – 27/7: Weekendafluiting A9 (Badhoevedorp – Holendrecht v.v.)						
Spoorwerkzaamheden	• 3/7 – 16/8: Geen metro tussen Zuid en Spaklerweg/Van der Madeweg						
Evenementen	• 24/7 – 2/8: Gay pride • 24/7 – 26/7 Liquidity Festival geesterambacht						
Aandachtspunten/ acties							
Score week	AMS = 1	NHZ = 1	HIJ = 3	ALK = 1	ZW = 1	GV = 2	
Score weekend	AMS = 1	NHZ = 1	HIJ = 3	ALK = 1	ZW = 1	GV = 2	

Periode	Week 31						
Werkzaamheden	• 26/6 – 16/8: S108 gestremd t.h.v. A10 • 1/7 – 1/2: Werkzaamheden De Boelelaan midden (Parnassusweg – Beethovenstraat (AMS-Zuid) • 1/7 – 1/12 werkzaamheden kruispunt Beethovenstraat / Apollolaan (AMS-Zuid) • 3/7 – 17/8: GVO A1 HRL (Eemnes – Muiderberg) dicht • 13/7 – 1/8 werkzaamheden kruispunt De Boelelaan / Parnassusweg (AMS-Zuid) • 13/7 – 8/8: Wijkertunnel 4 weken dicht						
Spoorwerkzaamheden	• 3/7 – 16/8: Geen metro tussen Zuid en Spaklerweg/Van der Madeweg • 2/8 – 16/8 Geen treinverkeer Almere - Weesp						
Evenementen	• 24/7 – 2/8: Gay pride • 1/8: Canal pride • Keukenhof: Castlefest						
Aandachtspunten/ acties							
Score week	AMS = 1	NHZ = 1	HIJ = 3	ALK = 1	ZW = 1	GV = 2	
Score weekend	AMS = 1	NHZ = 1	HIJ = 3	ALK = 1	ZW = 1	GV = 2	

Periode	Week 32						
Werkzaamheden	• 26/6 – 16/8: S108 gestremd t.h.v. A10 • 1/7 – 1/2: Werkzaamheden De Boelelaan midden (Parnassusweg – Beethovenstraat (AMS-Zuid) • 1/7 – 1/12 werkzaamheden kruispunt Beethovenstraat / Apollolaan (AMS-Zuid) • 3/7 – 17/8: GVO A1 HRL (Eemnes – Muiderberg) dicht • 13/7 – 8/8: Wijkertunnel 4 weken dicht						

	3/8 – 15/8 werkzaamheden kruispunt De Boelelaan / Amstelveenseweg (AMS-Zuid)					
Spoorwerkzaamheden	3/7 – 16/8: Geen metro tussen Zuid en Spaklerweg/Van der Madeweg 2/8 – 16/8: Geen treinverkeer Almere – Weesp 4/8 – 6/8: geen treinverkeer Zaandam – Sloterdijk 6/8 – 8/8: Geen treinverkeer Heerhugowaard - Hoorn					
Evenementen	8/8: Dancevalley Spaarnwoude 9/8 – 10/8: Dutchvalley Spaarnwoude					
Aandachtspunten/acties						
Score week	AMS = 1	ZW=1	NHZ = 1	GV = 2	Hij = 3	ALK = 1
Score weekend	AMS = 1		NHZ = 1	GV = 2		

Periode	Week 33					
Werkzaamheden	26/6 – 16/8: S108 gestremd t.h.v. A10 1/7 – 1/2: Werkzaamheden De Boelelaan midden (Parnassusweg – Beethovenstraat (AMS-Zuid) 1/7 – 1/12 werkzaamheden kruispunt Beethovenstraat / Apollolaan (AMS-Zuid) 3/7 – 17/8: GVO A1 HRL (Eemnes – Muiderberg) dicht 3/8 – 15/8 werkzaamheden kruispunt De Boelelaan / Amstelveenseweg (AMS-Zuid) 13/8 – 17/8: Waterwolftunnel N201 dicht 14/8 – 17/8: kruispunt N232/N201 dicht 14/8 – 12/12: N248 dicht in westelijke richting tussen Middenmeer en Kolhorn					
Spoorwerkzaamheden	3/7 – 16/8: Geen metro tussen Zuid en Spaklerweg/Van der Madeweg 2/8 – 16/8: Geen treinverkeer Almere - Weesp					
Evenementen	16/8: R2 Spaarnwoude 17/8: Latin Village Spaarnwoude					
Aandachtspunten/acties						
Score week	AMS = 1	NHZ = 1	GV = 2			
Score weekend	AMS = 2	NHZ = 2	GV = 2	KNH = 2		

Periode	Week 34					
Werkzaamheden	1/7 – 1/2: Werkzaamheden De Boelelaan midden (Parnassusweg – Beethovenstraat (AMS-Zuid) 1/7 – 1/12: werkzaamheden kruispunt Beethovenstraat / Apollolaan (AMS-Zuid) 3/8 – 15/8 werkzaamheden kruispunt De Boelelaan / Amstelveenseweg (AMS-Zuid) 27/8 – 30/8: N200 Zeeweg dicht i.v.m. DGP 21/8 – 24/8: Weekendafluiting A8 ri A10n (Coentunnel) 21/8 – 24/8: Weekendafluiting A4h + A4HRL rs 3 dicht (knp De Nieuwe Meer) 21/8 – 24/8: Weekend-afsluiting A10/A4: in Knp. De Nieuwe Meer (A4>A10W) 21/8 – 24/8: Waterwolftunnel N201 dicht 20/8 – 24/8 kruispunt N232/N201 dicht 14/8 – 12/12: N248 dicht in westelijke richting tussen Middenmeer en Kolhorn					
Spoorwerkzaamheden						
Evenementen	21/8 – 23/8: Dutch Grand prix					
Aandachtspunten/acties						
Score week	AMS = 1			Hij = 2	KNH = 2	

Score weekend	AMS = 3	ZW = 1	NHZ = 3	Hij = 2	KNH = 2
---------------	---------	--------	---------	---------	---------

Periode	Week 35				
Werkzaamheden	1/7 – 1/2: Werkzaamheden De Boelelaan midden (Parnassusweg – Beethovenstraat (AMS-Zuid)) 1/7 – 1/12: werkzaamheden kruispunt Beethovenstraat / Apollolaan (AMS-Zuid) 28/8 – 31/8: Weekendafluiting A8 ri A10n (Coentunnel) 14/8 – 12/12: N248 dicht in westelijke richting tussen Middenmeer en Kolhorn 24/8 – 23/10: N249 dicht tussen N248 en N99 28/8 – 31/8: Weekendafluiting A9 (Badhoevedorp – Holendrecht v.v.) 27/8 – 31/8: Waterwolfunnel N201 dicht 28/8 – 31/8 kruispunt N232/N201 dicht				
Spoorwerkzaamheden	29/8 – 31/8 geen terinverkeer Weesp - Hilversum				
Evenementen					
Aandachtspunten/acties					
Score week	AMS = 1		Hij = 2	KNH = 3	
Score weekend	AMS = 2	NHZ = 2	Hij = 2	KNH = 3	

Periode	Week 36				
Werkzaamheden	1/7 – 1/2: Werkzaamheden De Boelelaan midden (Parnassusweg – Beethovenstraat (AMS-Zuid)) 1/7 – 1/12: werkzaamheden kruispunt Beethovenstraat / Apollolaan (AMS-Zuid) 14/8 – 12/12: N248 dicht in westelijke richting tussen Middenmeer en Kolhorn 24/8 – 23/10: N249 dicht tussen N248 en N99 4/9 – 7/9: Weekendafluiting Badhoevedorp vbw A9 Li+Re > A4 Schiphol				
Spoorwerkzaamheden	6/9: M52 (N-Z lijn) rijdt tot Europaplein i.p.v. Zuid 5/9 – 7/9 geen treinverkeer Weesp – Muiderpoort/Duivendrecht				
Evenementen					
Aandachtspunten/acties					
Score week	AMS = 1		KNH = 3		
Score weekend	AMS = 1	NHZ = 1	KNH = 3		

Periode	Week 37				
Werkzaamheden	1/7 – 1/2: Werkzaamheden De Boelelaan midden (Parnassusweg – Beethovenstraat (AMS-Zuid)) 1/7 – 1/12: werkzaamheden kruispunt Beethovenstraat / Apollolaan (AMS-Zuid) 14/8 – 12/12: N248 dicht in westelijke richting tussen Middenmeer en Kolhorn 24/8 – 23/10: N249 dicht tussen N248 en N99 11/9 – 14/9: Weekendafluiting A9 (Holendrecht - Badhoevedorp v.v.) 10/9 – 14/9: N205 dicht vanaf Rottepolderplein tot Prins Bernhardlaan				
Spoorwerkzaamheden	12/9 – 14/9: Geen treinverkeer Amsterdam Centraal – Diemen/Duivendrecht 12/9 – 14/9: Geen treinverkeer Haarlem - Zandvoort				
Evenementen					
Aandachtspunten/acties					
Score week	AMS = 1			ZW = 1	KNH = 3
Score weekend	AMS = 2	NHZ = 2	Hij = 2	ZW = 1	KNH = 3

Periode	Week 38				
Werkzaamheden	1/7 – 1/2: Werkzaamheden De Boelelaan midden (Parnassusweg – Beethovenstraat (AMS-Zuid) 1/7 – 1/12: werkzaamheden kruispunt Beethovenstraat / Apollolaan (AMS-Zuid) 14/8 – 12/12: N248 dicht in westelijke richting tussen Middenmeer en Kolhorn 24/8 – 23/10: N249 dicht tussen N248 en N99 14/9 - 28/9 N205 2.0 systeem zuidkant 18/9 – 21/9: Weekendafluiting A10 HRL Coentunnel West I 18/9 – 21/9: Weekendafluiting verbw A10W -> A4				
Spoorwerkzaamheden					
Evenementen	19/9 – 20/9: Dam tot Damloop				
Aandachtspunten/ acties					
Score week	AMS = 1	NHZ = 1	HIJ = 2	KNH = 3	
Score weekend	AMS = 2	NHZ = 1	HIJ = 2	KNH = 3	

Periode	Week 39				
Werkzaamheden	1/7 – 1/2: Werkzaamheden De Boelelaan midden (Parnassusweg – Beethovenstraat (AMS-Zuid) 14/8 – 12/12: N248 dicht in westelijke richting tussen Middenmeer en Kolhorn 24/8 – 23/10: N249 dicht tussen N248 en N99 1/7 – 1/12: werkzaamheden kruispunt Beethovenstraat / Apollolaan (AMS-Zuid) 14/9 - 28/9 N205 2.0 systeem zuidkant 25/9 – 28/9: Weekendafluiting A9 (Holendrecht – Badhoevedorp v.v.)				
Spoorwerkzaamheden	26/9 – 28/9 geen treinverkeer Weesp - Duivendrecht				
Evenementen					
Aandachtspunten/ acties					
Score week	AMS = 1	NHZ = 1	HIJ = 2	KNH = 3	
Score weekend	AMS = 2	NHZ = 2	HIJ = 2	KNH = 3	

Periode	Week 40				
Werkzaamheden	1/7 – 1/2: Werkzaamheden De Boelelaan midden (Parnassusweg – Beethovenstraat (AMS-Zuid) 1/7 – 1/12: werkzaamheden kruispunt Beethovenstraat / Apollolaan (AMS-Zuid) 14/8 – 12/12: N248 dicht in westelijke richting tussen Middenmeer en Kolhorn 24/8 – 23/10: N249 dicht tussen N248 en N99 28/9 - 5/10 N205 2.0 systeem noordkant 2/10 – 4/10: A10 verbw. De Nieuwe Meer A10 Z -> A10 W dicht				
Spoorwerkzaamheden	3/10 – 6/10: geen treinverkeer Muiderpoort – Bijlmer 3/10 – 6/10 Geen treinverkeer Amsterdam Centraal				
Evenementen					
Aandachtspunten/ acties					
Score week	AMS = 1	HIJ = 2	KNH = 3		
Score weekend	AMS = 1	HIJ = 2	KNH = 3		

Periode	Week 41				
Werkzaamheden	1/7 – 1/2: Werkzaamheden De Boelelaan midden (Parnassusweg – Beethovenstraat (AMS-Zuid)				

	1/7 – 1/12: werkzaamheden kruispunt Beethovenstraat / Apollolaan (AMS-Zuid) 14/8 – 12/12: N248 dicht in westelijke richting tussen Middenmeer en Kolhorn 24/8 – 23/10: N249 dicht tussen N248 en N99 5/10 – 11/10 N205 Schipholweg/Drie Merenweg verbindingswegen ri Rottepolderplein dicht 8/10 – 12/10: Buitenrustbrug dicht (N205) Haarlem in 9/10 – 12/10: Weekendafluiting A9 (Holendrecht – Badhoevedorp v.v.)				
Spoorwerkzaamheden	5/10 – 12/10: Geen treinverkeer Heerhugowaard – Hoorn 10/10 – 12/10: Geen treinverkeer Haarlem – Leiden 11/10 – 12/10: Geen treinverkeer Breukelen – Bijlmer ArenA				
Evenementen					
Aandachtspunten/acties					
Score week	AMS = 1		Hij = 2	KNH = 3	
Score weekend	AMS = 2	NHZ = 2	Hij = 3	KNH = 3	

Periode	Week 42				
Werkzaamheden	1/7 – 1/2: Werkzaamheden De Boelelaan midden (Parnassusweg – Beethovenstraat (AMS-Zuid) 1/7 – 1/12: werkzaamheden kruispunt Beethovenstraat / Apollolaan (AMS-Zuid) 14/8 – 12/12: N248 dicht in westelijke richting tussen Middenmeer en Kolhorn 24/8 – 23/10: N249 dicht tussen N248 en N99 12/10 – 16/10: N205 Schipholweg verbindingswegen ri N205 Drie Merenweg dicht 16/10 – 19/10 N205 Drie Merenweg dicht Tussen N205 Schipholweg en Vijfhuizen				
Spoorwerkzaamheden	12/10 – 17/10: Geen treinverkeer Uitgeest – Alkmaar/Zaandam 17/10 – 19/10: Geen treinverkeer Weesp – Amsterdam CS / Duivendrecht				
Evenementen					
Aandachtspunten/acties					
Score week	AMS = 1	Hij = 2	ALK = 1		KNH = 3
Score weekend	AMS = 1	Hij = 2		NHZ = 1	KNH = 3

Periode	Week 43				
Werkzaamheden	1/7 – 1/2: Werkzaamheden De Boelelaan midden (Parnassusweg – Beethovenstraat (AMS-Zuid) 1/7 – 1/12: werkzaamheden kruispunt Beethovenstraat / Apollolaan (AMS-Zuid) 14/8 – 12/12: N248 dicht in westelijke richting tussen Middenmeer en Kolhorn 24/8 – 23/10: N249 dicht tussen N248 en N99 7/9 – 31/12: N244 (vierweekse afsluiting in deze periode) 19/10 – 25/10 N205 Drie Merenweg verbindingswegen ri N205 Schipholweg dicht. 23/10 – 26/10: Weekendafluiting A9 (Holendrecht – Badhoevedorp v.v.) 23/10 – 26/10: Weekendafluiting N247 t.h.v. Monnickendam				
Spoorwerkzaamheden					
Evenementen	25/10: Marathon Amsterdam				
Aandachtspunten/acties					
Score week	AMS = 1	NHZ = 1		Hij = 2	KNH = 3
Score weekend	AMS = 2	NHZ = 2	ZW = 2	Hij = 2	KNH = 2

Periode	Week 44				
Werkzaamheden	1/7 – 1/2: Werkzaamheden De Boelelaan midden (Parnassusweg – Beethovenstraat (AMS-Zuid) 1/7 – 1/12: werkzaamheden kruispunt Beethovenstraat / Apollolaan (AMS-Zuid) 14/8 – 12/12: N248 dicht in westelijke richting tussen Middenmeer en Kolhorn 26/10 – 1/11: Reserve N205 werkzaamheden 26/10 – 4/12: N247 2-0 systeem t.h.v. Monnickendam				
Spoorwerkzaamheden	1/11 – 2/11: Geen treinverkeer Breukelen – Bijlmer ArenA				
Evenementen					
Aandachtspunten/acties					
Score week	AMS = 1	ZW = 1	Hij = 2	KNH = 2	
Score weekend	AMS = 1	ZW = 1	Hij = 2	KNH = 2	

Periode	Week 45					
Werkzaamheden	1/7 – 1/2: Werkzaamheden De Boelelaan midden (Parnassusweg – Beethovenstraat (AMS-Zuid) 1/7 – 1/12: werkzaamheden kruispunt Beethovenstraat / Apollolaan (AMS-Zuid) 14/8 – 12/12: N248 dicht in westelijke richting tussen Middenmeer en Kolhorn 26/10 – 4/12: N247 2-0 systeem t.h.v. Monnickendam 2/11 – 14/11 Zeeweg Castricum dicht in beide richtingen 6/11 – 9/11: RES Weekendafluiting A9 (Holendrecht – Badhoevedorp v.v.) 6/11 – 9/11: Weekendafluiting N516					
Spoorwerkzaamheden	2/11 – 7/11: Geen treinverkeer Haarlem – Uitgeest					
Evenementen						
Aandachtspunten/acties						
Score week	AMS = 1	ZW = 1		Hij = 1	ALK = 1	KNH = 2
Score weekend	AMS = 2	ZW = 2	NHZ = 2	Hij = 1	ALK = 1	KNH = 2

Periode	Week 46				
Werkzaamheden	1/7 – 1/2: Werkzaamheden De Boelelaan midden (Parnassusweg – Beethovenstraat (AMS-Zuid) 1/7 – 1/12: werkzaamheden kruispunt Beethovenstraat / Apollolaan (AMS-Zuid) 14/8 – 12/12: N248 dicht in westelijke richting tussen Middenmeer en Kolhorn 26/10 – 4/12: N247 2-0 systeem t.h.v. Monnickendam 9/11 – 11/11: Provincialeweg Castricum overdag dicht in beide richtingen 13/11 – 16/11: Weekendafluiting N516				
Spoorwerkzaamheden	9/11 – 21/11: Geen treinverkeer Alkmaar – Den Helder 14/11 – 16/11: Geen treinverkeer Leiden – Haarlem - Sloterdijk				
Evenementen					
Aandachtspunten/acties					
Score week	AMS = 1	ZW = 1	ALK = 1	KNH = 2	
Score weekend	AMS = 1	ZW = 2		KNH = 2	

Periode	Week 47				
Werkzaamheden	1/7 – 1/2: Werkzaamheden De Boelelaan midden (Parnassusweg – Beethovenstraat (AMS-Zuid) 1/7 – 1/12: werkzaamheden kruispunt Beethovenstraat / Apollolaan (AMS-Zuid)				

	14/8 – 12/12: N248 dicht in westelijke richting tussen Middenmeer en Kolhorn 26/10 – 4/12: N247 2-0 systeem t.h.v. Monnickendam 20/11 – 23/11: RES Weekendafluiting N516				
Spoorwerkzaamheden	9/11 – 21/11: geen treinverkeer Alkmaar – Den Helder 16/11 – 5/12: Geen treinverkeer Haarlem - Zandvoort				
Evenementen					
Aandachtspunten/ acties					
Score week	AMS = 1	ZW = 1	KNH = 2		
Score weekend	AMS = 1	ZW = 1	KNH = 2		

Periode	Week 48				
Werkzaamheden	1/7 – 1/2: Werkzaamheden De Boelelaan midden (Parnassusweg – Beethovenstraat (AMS-Zuid) 1/7 – 1/12: werkzaamheden kruispunt Beethovenstraat / Apollolaan (AMS-Zuid) 14/8 – 12/12: N248 dicht in westelijke richting tussen Middenmeer en Kolhorn 26/10 – 4/12: N247 2-0 systeem t.h.v. Monnickendam 27/11 – 30/11: Weekendafluiting A10 HRR (Amstel – De Nieuwe Meer) + A10 HRR in knp Watergraafstmeer & knp Amstel 27/11 – 30/11: RES Weekendafluiting N516				
Spoorwerkzaamheden	16/11 – 5/12: Geen treinverkeer Haarlem – Zandvoort 25/11 – 29/11 :Geen treinverkeer Beverwijk – Uitgeest 27/11 – 29/11: Geen treinverkeer Uitgeest – Alkmaar 27/11 – 28/11: Minder metrocapaciteit bij Amsterdam Zuid (M2 & M4 dicht				
Evenementen					
Aandachtspunten/ acties					
Score week	AMS = 1	ZW = 1		KNH = 2	
Score weekend	AMS = 2	ZW = 1	NHZ = 2	KNH = 2	

Periode	Week 49				
Werkzaamheden	1/7 – 1/2: Werkzaamheden De Boelelaan midden (Parnassusweg – Beethovenstraat (AMS-Zuid) 1/7 – 1/12: werkzaamheden kruispunt Beethovenstraat / Apollolaan (AMS-Zuid) 26/10 – 4/12: N247 2-0 systeem t.h.v. Monnickendam 4/12 – 7/12: Weekendafluiting N247 t.h.v. Monnickendam				
Spoorwerkzaamheden	16/11 – 5/12: Geen treinverkeer Haarlem - Zandvoort				
Evenementen					
Aandachtspunten/ acties					
Score week	AMS = 1	ZW = 1	KNH = 2		
Score weekend	AMS = 1	ZW = 2	KNH = 2		

Periode	Week 50				
Werkzaamheden	1/7 – 1/2: Werkzaamheden De Boelelaan midden (Parnassusweg – Beethovenstraat (AMS-Zuid) 14/8 – 12/12: N248 dicht in westelijke richting tussen Middenmeer en Kolhorn 11/12 – 14/12: Weekendafluiting A10 HRL (De Nieuwe Meer West → Zuid)				
Spoorwerkzaamheden	11/12 – 13/12: Geen metro tussen Zuid – Henk Sneevlietweg				

Evenementen					
Aandachtspunten/ acties					
Score week	AMS = 1	KNH = 2			
Score weekend	AMS = 1	KNH = 2			

Periode	Week 51				
Werkzaamheden	1/7 – 1/2: Werkzaamheden De Boelelaan midden (Parnassusweg – Beethovenstraat (AMS-Zuid) 18/12 – 21/12: Weekend-afsluiting A10 HRR (S108 - Nieuwe Meer) + HRR in knp Watergraafsmeer + Amstel				
Spoorwerkzaamheden					
Evenementen					
Aandachtspunten/ acties					
Score week	AMS = 1				
Score weekend	AMS = 2	NHZ = 2			

Periode	Week 52				
Werkzaamheden	1/7 – 1/2: Werkzaamheden De Boelelaan midden (Parnassusweg – Beethovenstraat (AMS-Zuid)				
Spoorwerkzaamheden					
Evenementen					
Aandachtspunten/ acties					
Score week	AMS = 1				
Score weekend	AMS = 1				

Bijlage 3 deelnemerslijst

Onderstaand de aanwezige stakeholders tijdens de sessie op dinsdag 16 juni 2026.

- Provincie Noord-Holland
- Amsterdam
- Rijkswaterstaat
- ManenGenius en Arcadis
